


PROJECTPLANNING HANDELSDOK WEST - GENT

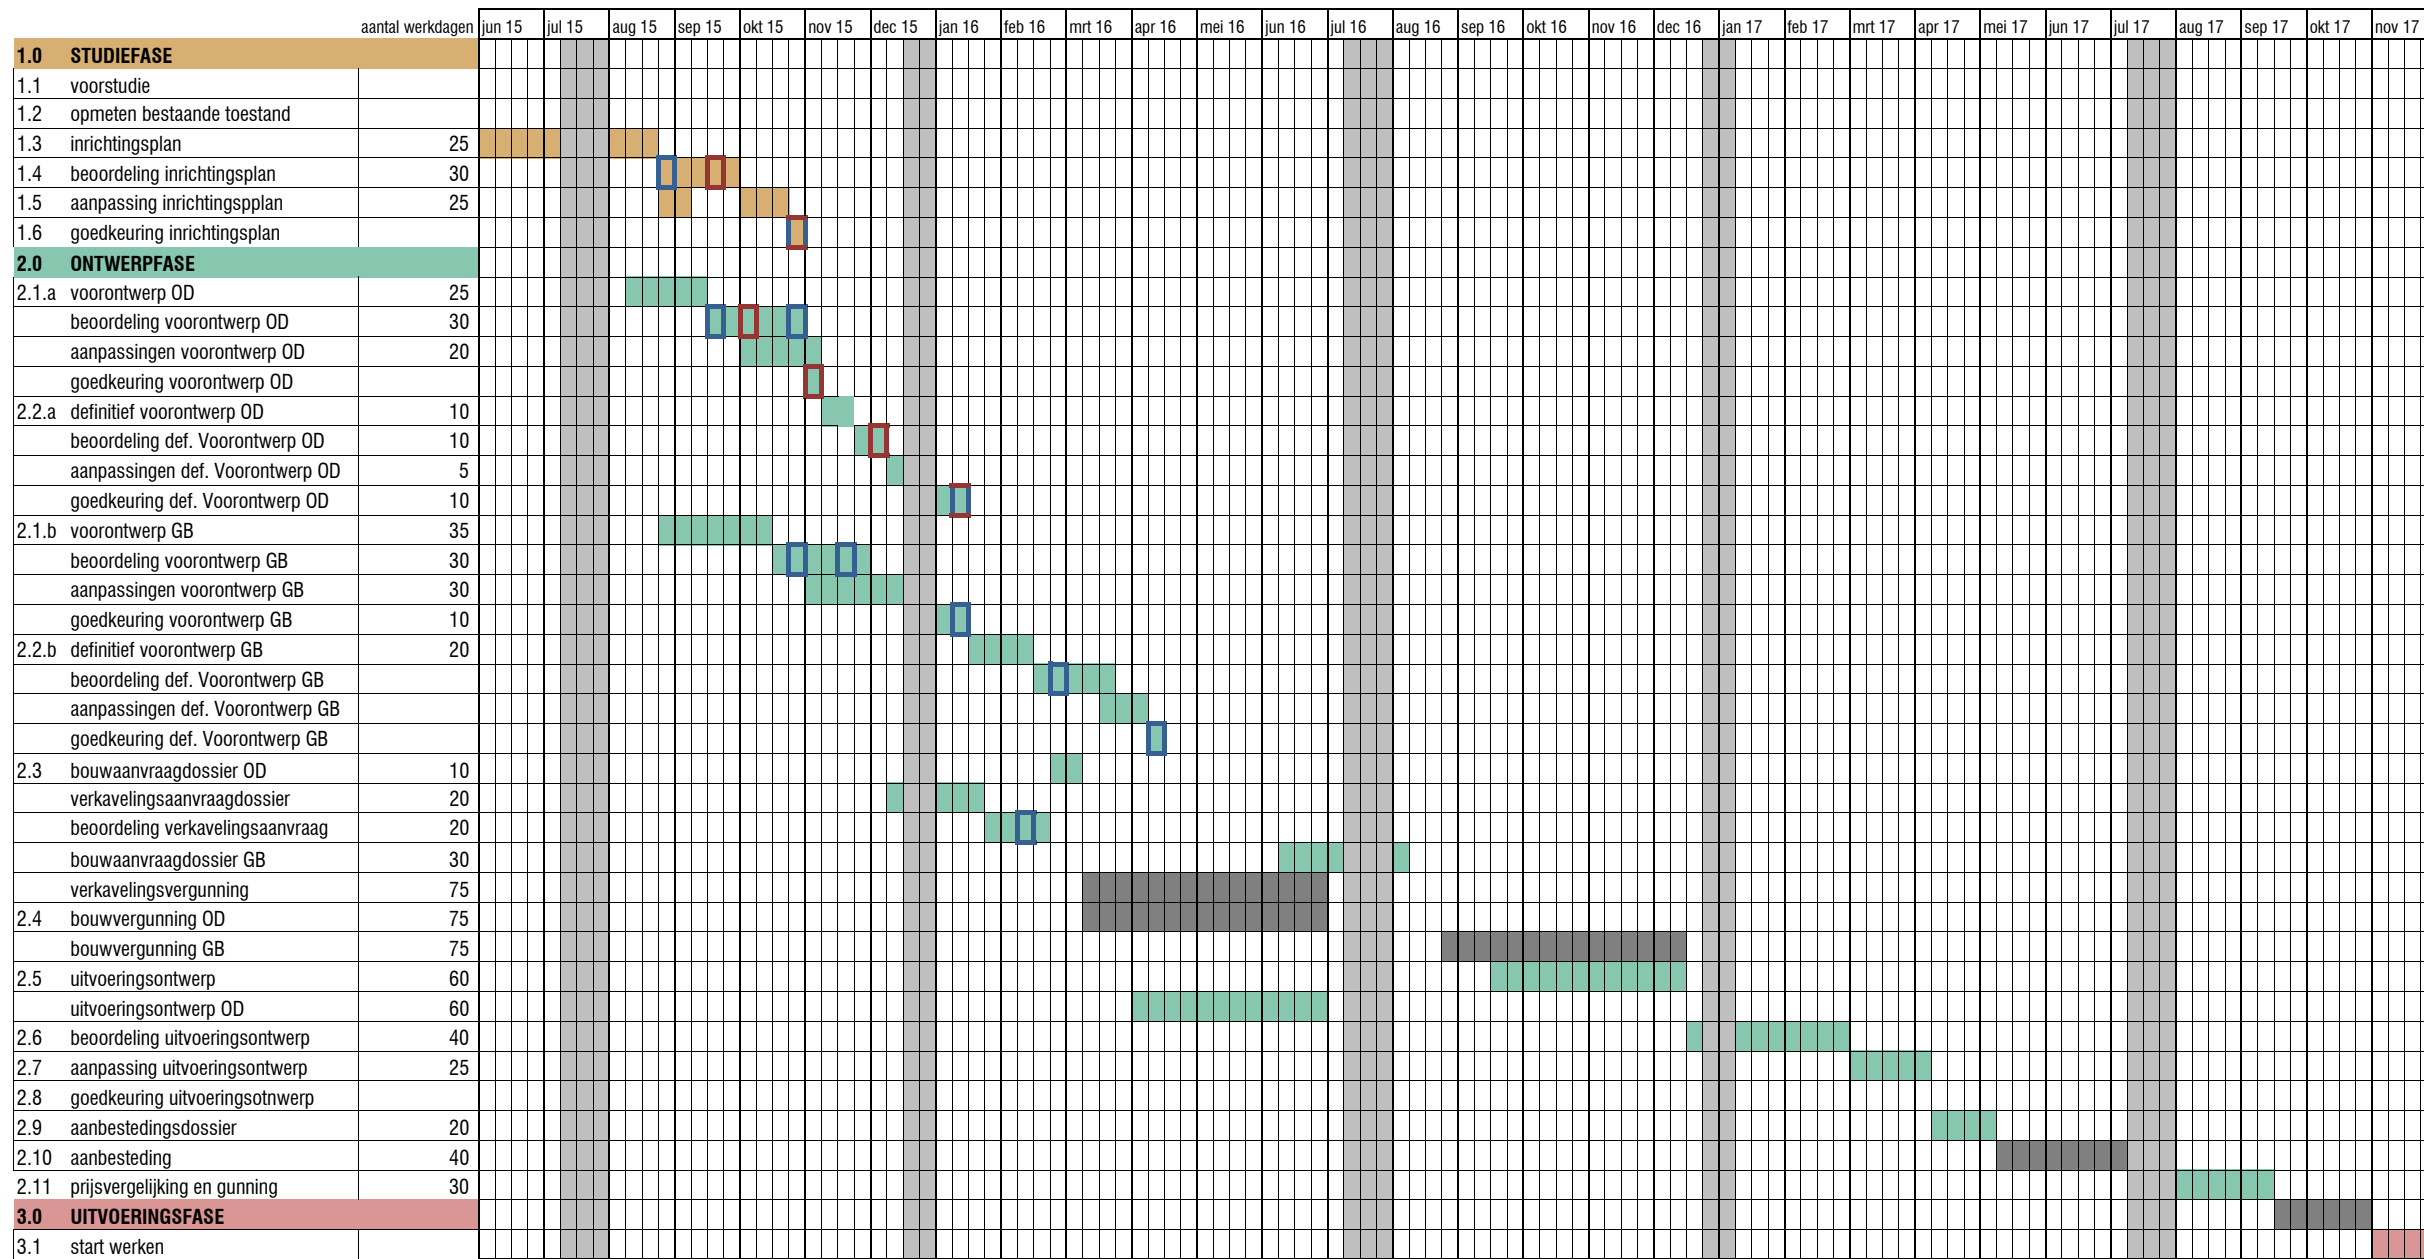

BEOORDELING DOOR IKZ
 OVERLEGMOMENT DSRP

SCHETSONTWERP / INRICHTINGSPLAN¹ oktober 2015

VOORONTWERP² april 2016

VERKAVELINGSAANVRAAG³ maart 2016
 > verkavelingsvergunning 75d: juni 2016
 BOUWAANVRAAG OD³ maart 2016
 > bouwvergunning OD 75d: juni 2016
 BOUWAANVRAAG GB³ augustus 2016
 > bouwvergunning GB 75/105d: december 2016

UITVOERINGSONTWERP⁴ maart 2017

PUBLICATIE mei 2017
 > ontvangen offertes min. 36d
 prijsvergelijking incl. nazicht protect
 sperperiode na gunning 15d, bestelperiode aannemer 30d
 START WERKEN november 2017

¹° adviezen werkgroep openbaar domein, Oude Dokken
²° adviezen stedenbouw/brandweer/toegankelijkheid/nutsmaatschappijen
 adviezen IKZ, kwaliteitskamer
³° pre-adviezen kwaliteitskamer, stadsdiensten
⁴° adviezen IKZ, werkgroep Oude Dokken
